



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do


Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Enero-Marzo

CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA


Acueductos	Muestras programadas	# de Muestra Sembradas	# de Tubos sembrados	# de tubos Coliformes motolerables	Nº. De Tubos Coliformes Fecales	% IP (> 95%)	% de Puntos con Cloración	% Envío de Muestra	Índice de Calidad	Punto con Pseudomonas	Mes			
La Dura	80	78	390	8	0	100.00	100	98	97.50	4	Enero			
Monte De La Jagua	20	16	80	8	8	90.00	88	80	72.00	2	Enero			
Ac Juan López	8	6	30	4	2	93.33	83	75	70.00	0	Enero			
Ac Las Lagunas	8	4	20	5	5	75.00	100	50	37.50	0	Enero			
Ac San Víctor	16	8	40	11	7	82.50	100	50	41.00	0	Enero			
Reparadero	8	3	15	0	0	100.00	100	38	37.50	0	Enero			
Moquita	20	20	100	4	1	99.00	100	100	99.00	0	Enero			
Quebrada Honda	16	12	60	0	0	100.00	100	75	75.00	0	Enero			
Villa Trina	8	8	40	0	0	100.00	100	100	100.00	0	Enero			
Cay Germ	16	8	40	3	2	95.00	100	50	47.50	4	Enero			
La Guama	16	16	80	0	0	100.00	94	100	100.00	0	Enero			
Hato Viejo	4	4	20	0	0	100.00	75	100	100.00	0	Enero			
El Carril	4	4	20	0	0	100.00	100	100	100.00	2	Enero			
Calle Del Río	4	4	20	2	2	90.00	25	100	90.00	1	Enero			
Jamao Al Norte	8	8	40	0	0	100.00	100	100	100.00	0	Enero			
Los Branos	2	1	5	0	0	100.00	100	50	50.00	0	Enero			
Gaspar H	8	8	40	0	0	100.00	100	100	100.00	0	Enero			
veragua	4	4	20	5	5	75	100	100	75.00	0	Enero			
Batey	2	1	5	0	0	100	100	50	50.00	0	Enero			

Acueductos	Nº. Muestras Programadas	Nº. de Muestras Recibidas	Nº de Tubos Sembrados	% Envío de Muestras	Nº. de tubos con Col Totales	Nº. de Tubos con col Fecales	Nº. de muestras positivas a coliformes	Muestras neg a la presencia de coliformes	% IP	Índice de la calidad de la gestión del muestreo	Muestras con Pseudomonas	Nº Muestras con col fecales	% de puntos con cloración	Mes
La Dura	76	76	380	100	0	0	0	380	100.00	100	5	0	100	Febrero
Monte De La Jagua	16	16	80	100	1	1	1	79	98.75	99	1	1	100	Febrero
Ac Juan López	16	16	80	100	2	2	1	79	98.75	99	0	1	100	Febrero
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	9	4	3	77	96.25	96	0	4	100	Febrero
Ac San Víctor	20	20	100	100	9	7	5	95	95.00	95	1	4	100	Febrero
Reparadero	10	10	50	100	6	6	3	47	94.00	94	0	3	100	Febrero
Moquita	16	16	80	100	19	19	7	73	91.25	91	1	7	100	Febrero
Quebrada Honda	16	12	60	75	4	4	3	57	95.00	71	0	3	100	Febrero
Cay Germ	16	16	80	100	2	2	2	78	97.50	98	4	2	100	Febrero
La Guama	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	3	0	81.25	Febrero
Hato Viejo	4	4	20	100	3	3	1	19	95.00	95	0	1	100	Febrero
El Carril	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	75	Febrero
Calle Del Río	4	4	20	100	4	2	1	19	95.00	95	0	1	75	Febrero
Villa Progreso	5	5	25	100	7	7	3	22	88.00	88	1	3	80	Febrero
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Febrero
Los Branos	2	1	5	50	0	0	0	5	100.00	50	0	0	100	Febrero
Gaspar H	8	7	35	88	7	7	2	33	94.29	83	0	2	100	Febrero
veragua	4	4	20	100	15	15	3	17	85.00	85	0	3	100	Febrero
Batey	2	2	10	100	5	5	1	9	90.00	90	0	1	100	Febrero
Bejuco Blanco	2	1	5	0	0	0	0	5	100.00	50	0	0	100	Febrero
La Dura	76	76	380	100	3	0	2	378	99.47	99	0	0	100	Marzo
Monte De La Jagua	20	20	100	100	0	0	0	100	100.00	100	0	0	100	Marzo
Ac Juan López	16	16	80	100	4	4	1	79	98.75	99	0	1	100	Marzo
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	100	Marzo
Ac San Víctor	16	12	60	75	10	9	4	56	93.33	70	3	4	100	Marzo
Reparadero	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Marzo
Moquita	20	20	100	100	11	8	4	96	96.00	96	1	4	100	Marzo
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	1	0	100	Marzo
Quebrada Honda	20	20	100	100	10	1	3	97	97.00	97	1	2	100	Marzo
Cay Germ	20	20	100	100	0	0	0	100	100.00	100	2	0	100	Marzo
La Guama	20	20	100	100	4	3	2	98	98.00	98	2	2	80	Marzo
Hato Viejo	5	5	25	100	2	2	1	24	96.00	96	0	1	100	Marzo
El Carril	5	5	25	100	0	0	0	25	100.00	100	0	0	100	Marzo
Calle Del Río	5	4	20	80	0	0	0	20	100.00	80	0	0	100	Marzo
villa Progreso	5	4	20	80	0	0	0	20	100.00	80	0	0	100	Marzo
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Marzo
Los Branos	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Marzo
Cañalito Puesto Grande	1	1	5	100	0	0	0	5	100	100	0	0	100	Marzo
Gaspar H	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Marzo
Veragua	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Marzo
Batey	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Marzo

IP = Índice de Potabilidad
IP > 95% según normas internacionales

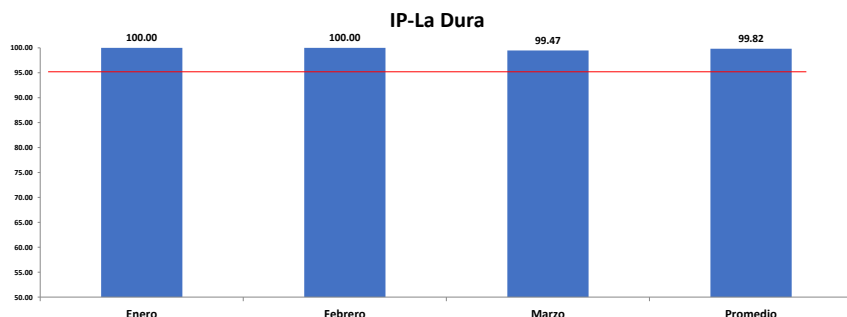

Indice de Potabilidad Provincial

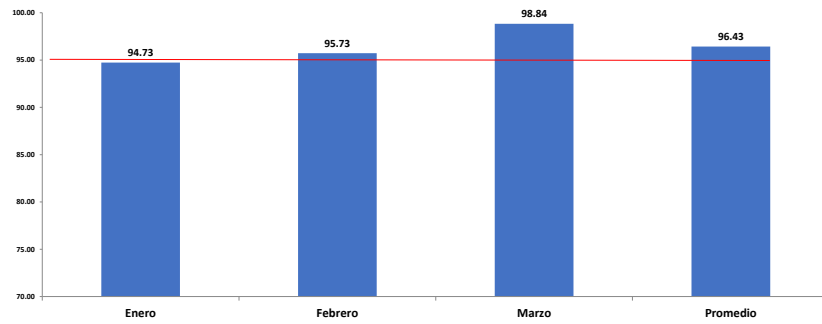

Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022
 Incluidos en el Control Sanitario
 Trimestre Enero-Marzo

Acueductos	Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m)	Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes,	Promedio PH a T.A (6.5-8.5)	Promedio Dureza (50- 500)Mg/L de CaCO2	Tipo de Fuente	Mes
La Dura	0.83	2.18	7.30	51.00	Presa	Enero
Monte De La Jagua	0.59	1.67	7.40	51.00	La Dura	Enero
Múltiple Juan López	0.52	1.89	7.20	51.00	Ac. Múltiple	Enero
Múltiple Las Lagunas	0.80	1.52	7.20	51.00	Ac. Múltiple	Enero
Múltiple San Victor	0.35	2.70	7.30	51.00	Ac. Múltiple	Enero
Remaradero	0.57	2.89	7.30	51.00	La Dura	Enero
Moquita	0.98	1.78	7.70	139.00	Arroyo	Enero
Villa Trina	0.85	3.99	7.90	161.00	Rio	Enero
Quebra Honda	0.75	1.89	7.20	51.00	La Dura	Enero
Cavetano Germosen	0.90	4.54	7.50	272.00	Pozo	Enero
La Guama	0.42	2.00	7.60	263.00	Pozo	Enero
Hato Viejo	0.95	2.72	7.40	289.00	Pozo	Enero
Carril	0.92	1.16	7.40	296.00	Pozo	Enero
Calle Del Rio	0.60	1.31	7.50	272.00	Pozo	Enero
Jamas Al Norte	0.82	0.92	7.50	238.00	Pozo	Enero
Los Brazos	0.60	1.14	7.60	289.00	Pozo	Enero
Gaspar Hernandez	1.01	1.99	7.60	246.00	Pozo	Enero
Veragua	0.76	1.35	7.50	228.00	Pozo	Enero
Batey	1.10	0.70	7.50	221.00	Pozo	Enero
La Dura	0.76	2.50	7.20	51.00	Presa	Febrero
Monte De La Jagua	0.74	2.50	7.20	51.00	La Dura	Febrero
Múltiple Juan López	0.66	2.41	7.30	51.00	Ac. Múltiple	Febrero
Múltiple Las Lagunas	0.75	2.45	7.10	51.00	Ac. Múltiple	Febrero
Múltiple San Victor	0.79	2.45	7.60	51.00	Ac. Múltiple	Febrero
Reparadero	0.64	2.18	7.30	51.00	La Dura	Febrero
Moquita	0.99	2.97	7.50	267.00	Arroyo	Febrero
Quebra Honda	0.65	3.28	7.20	51.00	La Dura	Febrero
Cavetano Germosen	1.07	1.81	7.60	301.00	Pozo	Febrero
La Guama	0.34	0.67	7.50	289.00	Pozo	Febrero
Hato Viejo	1.50	0.88	7.50	301.00	Pozo	Febrero
Carril	1.02	0.66	7.50	301.00	Pozo	Febrero
Calle Del Rio	0.72	2.17	7.50	271.00	Pozo	Febrero
Villa ucureso	0.72	0.83	7.60	255.00	Pozo	Febrero
Jamas Al Norte	1.00	0.85	7.60	297.00	Pozo	Febrero
Los Brazos	0.80	1.04	7.50	289.00	Pozo	Febrero
Gaspar Hernandez	1.05	1.47	7.60	272.00	Pozo	Febrero
Veragua	1.12	0.66	7.50	238.00	Pozo	Febrero
Batey	0.70	2.79	7.70	272.00	Pozo	Febrero
Beicu Blanco	0.40	2.06	7.20	68.00	Arroyo	Febrero
La Dura	0.78	2.17	7.30	51.00	Presa	Marzo
Monte De La Jagua	0.71	2.22	7.30	51.00	La Dura	Marzo
Múltiple Juan López	0.61	1.77	7.30	51.00	Ac. Múltiple	Marzo
Múltiple Las Lamanas	0.69	1.73	7.30	51.00	Ac. Múltiple	Marzo
Múltiple San Victor	0.60	1.81	7.30	51.00	Ac. Múltiple	Marzo
Remaradero	0.46	1.85	7.30	51.00	La Dura	Marzo
Moquita	1.21	7.62	7.80	241.00	Arroyo	Marzo
Villa Trina	0.90	3.18	7.80	170.00	Rio	Marzo
Quebra Honda	0.55	2.35	7.30	51.00	La Dura	Marzo
Cavetano Germosen	1.29	0.92	7.50	154.00	Pozo	Marzo
La Guama	0.41	0.94	7.40	268.00	Pozo	Marzo
Hato Viejo	1.22	3.97	7.40	269.00	Pozo	Marzo
Carril	1.32	0.75	7.30	282.00	Pozo	Marzo
Calle Del Rio	1.50	5.84	7.40	266.00	Pozo	Marzo
Villa Progreso	0.87	0.47	7.60	274.00	Pozo	Marzo
Jamas Al Norte	0.72	0.59	7.40	229.00	Pozo	Marzo
Los Brazos	1.00	0.68	7.60	338.00	Pozo	Marzo
Caimito Puerto Grande	0.40	5.50	7.70	238.00	Pozo	Marzo
Gaspar Hernandez	1.08	1.21	7.60	212.00	Pozo	Marzo
Veragua	1.00	0.67	7.50	187.00	Pozo	Marzo
Batey	1.00	0.67	7.70	204.00	Pozo	Marzo

Normas Internacionales	
Turbidez	(0-5) NTU
Cloro Residual	(0.2-0.9)PPM
Dureza	(50-500)MG/CACO3/100ML
Pb	(6.5-8.5)

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Enero	Febrero	Marzo
Cloro Residual	0.83	0.76	0.78
Turbidez en Redes,	2.18	2.50	2.17
PH	7.30	7.20	7.30
Dureza	51	51	51





Promedio de Todos Los Acueductos

Análisis	Enero	Febrero	Marzo
Cloro Residual	0.75	0.84	0.87
Turbidez en Redes,	2.02	1.83	2.23
Dureza	172.21	188.90	175.67

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Enero	Febrero	Marzo
LS	0.80	0.80	0.80
Cloro Residual	0.83	0.76	0.78
LI	0.20	0.20	0.20
LS	5.00	5.00	5.00
Turbidez redes,	2.18	2.50	2.17
LI	0.00	0.00	0.00
LS	8.5	8.5	8.5
I PH	7.3	7.2	7.3
LI	6.5	6.5	6.5
LS	50	50	50
Dureza	51	51	51
LI	50	50	50

Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura



Legenda
LS = Límite Superior
LI = Límite Inferior

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022

Trimestre Enero-Marzo


Acueducto	Fecha de Instalación	Fecha Término	Consumo	Descripción	Uso	Mes
La Dura	29/12/2021	31/1/2022	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Enero
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Enero
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Enero
Acueductos Rurales			133	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Enero
Veragua, etc.			180	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Enero
Villa trina			180	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Enero
Múltiple Juan López			190	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Enero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			90	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Enero
La Dura	1/2/2022	28/2/2022	8,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Febrero
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Febrero
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Febrero
Acueductos Rurales			523	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Febrero
Veragua, etc.			390	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Febrero
Villa trina				Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Febrero
Múltiple Juan López			190	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Febrero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			90	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Febrero
La Dura	1/3/2022	31/3/2022	14,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Marzo
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Marzo
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Marzo
Acueductos Rurales			550	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Marzo
Veragua, etc.			215	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Marzo
Villa trina			305	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Marzo
Múltiple Juan López			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Marzo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Marzo

Acueducto	Sustancia Química	Enero	Febrero	Marzo
La Dura	Cloro Gas (LBS)	10,000	8,000	14,000
La Dura	Sulfato de Aluminio (25kg)	-	-	-
La Dura	Sulfato de Aluminio (50kg)	-	-	-
Acueductos Rurales	Pastillas de cloro	133	523	550
Acueductos Rurales	Cloro granulado (LBS)	640	670	720



Producción Mensual de Agua (M³) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2022
Trimestre Enero-Marzo

Enero	Febrero	Marzo	Promedio
3,000,326	2,761,474	3,247,560	3,003,120

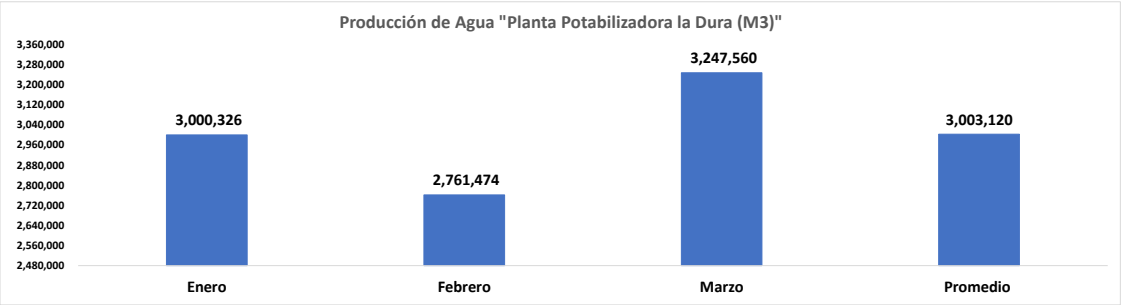




Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

CANTIDAD DE AVERÍAS CORREGIDAS														
Diámetro	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	16	20	Total
Enero	42	21	2	2	29	30	18	6	1	-	1	1	1	154
Febrero	44	22	6	4	8	23	6	9	1	-	1	2	-	126
Marzo	48	27	3	4	26	25	15	6	2	-	-	-	1	157

[illegible]

Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Cantidad De Trabajos Realizados	Enero	Febrero	Marzo	Promedio
Desatascos de redes principales	30	46	70	49
Desatascos de acometidas domiciliarias	18	31	44	31
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias	1	5	1	2
Reparación de acometida domiciliarias	1	1	8	3
Reparación de acometida multidomiciliarias	4	3	3	3
Reparación de la red de alcantarillado	3	4	7	5
Reparación de registro	2	0	0	1
Limpieza de registros de Inspección	18	19	24	20
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies)	48	19	33	33
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies)	27	34	69	43
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies)	144	9	169	107

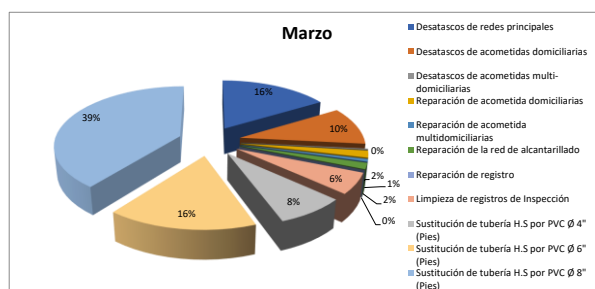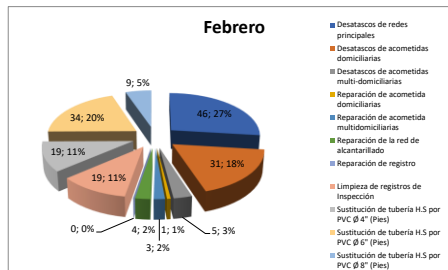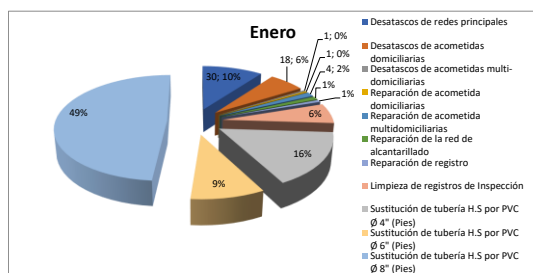


Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Enero-Marzo

Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Promedio
Recaudación	RD\$ 88,554.96	RD\$ 309,535.87	RD\$ 124,060	\$174,050
Cantidad	4	3	2	3


Ampliaciones de Redes Agua Potable

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Promedio
Cantidad	-	-	-	-
Costo	-	-	-	-

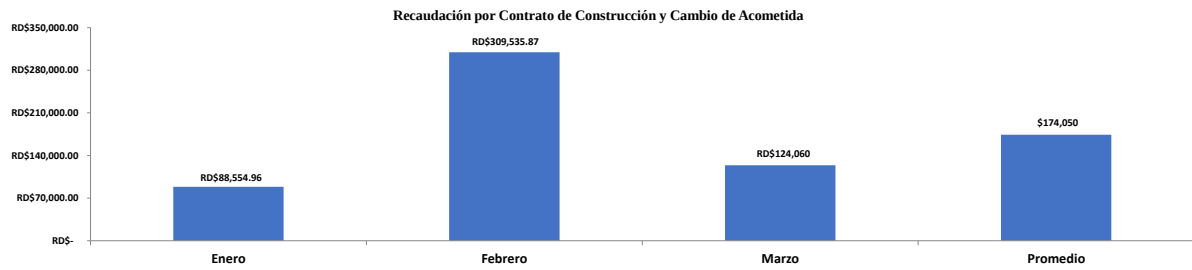

Estadística del Departamento Comercial 2022
Trimestre Enero-Marzo

Indicador	Enero	Febrero	Marzo	Promedio
Eficiencia de Recaudo	77%	82%	91%	83%
Facturación	18,634,740	18,608,668	18,499,217	18,580,875
Recaudación	14,363,423	15,300,860	16,775,628	15,479,970
Cientes medidos	3,729	3,633	4,446	3,936
Cientes no medidos	16,653	18,031	19,282	17,989
Cientes especiales	217	223	218	219
Cientes con alcantarillado	11,318	11,318	11,318	11,318
Cobertura de Micromedición	9.9%	9.7%	18.7%	12.8%
Micromedidores Instalados	3,946	3,856	4,664	4,155
Total de Clientes activos	20,599	22,567	24,884	22,683
Total de Clientes	39,772	39,855	40,184	41,482

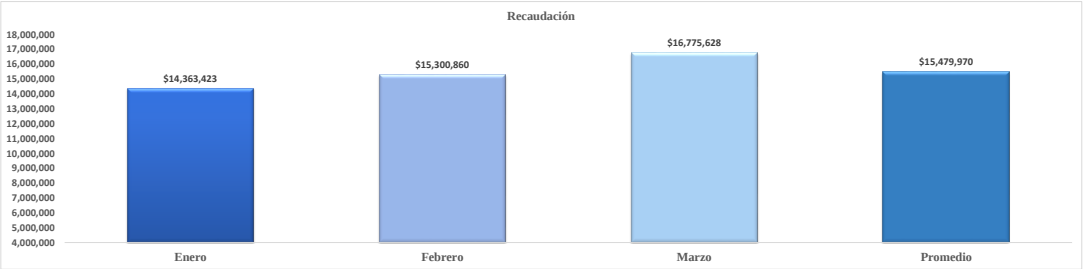

Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Enero-Marzo 2022

Cant. De Trabajos Realizados	Enero	Febrero	Marzo	Promedio
CANTIDAD DE MANZANAS	-	-	66	66
PREDIOS VISITADOS	-	-	1163	1163
CONTRATOS VERIFICADOS	-	-	644	644
CLIENTES NO REGISTRADOS	-	-	315	315
PREDIOS DESHABITADOS	-	-	38	38
CASAS CERRADAS	-	-	16	16
SOLARES	-	-	134	134
CONSTRUCCIÓN	-	-	25	25
METROS	-	-	15,564	15564

Cant. De Trabajos Realizados	Enero	Febrero	Marzo	Promedio
MANZANAS RE-MEDIDAS	0	0	4	1
MANZANAS MEDIDAS NUEVAS	0	0	8	3
PROPIEDADES CENSADAS	0	325	959	428
PROPIEDADES REMARCADAS	0	100	1104	401
CODIGOS CORREGIDOS	16	38	52	35
CERTIFICACION DE DOBLES CONTRATOS	3	13	5	7
VALIDACION DE NUEVOS CONTRATOS	29	58	54	47

